



ASSOCIATION MILITAIRE POUR L'INSERTION ET L'ORIENTATION

Cours 1

GDN100 MANAGEMENT DE PROJET

Julien Dumont GDN-100 1

1



ASSOCIATION MILITAIRE POUR L'INSERTION ET L'ORIENTATION

Présentation

- ▶ **Julien Dumont**
 - Directeur de projets
 - ✓ *Technique audiovisuelle (Maîtrise d'ouvrage)*
 - ✓ *Organisation / stratégie*
 - ✓ *Informatique*
 - Gestion de portefeuille de projets
- ▶ **Présentation des élèves**
 - Formation
 - Entreprise (en alternance)
 - Travaux en cours (sous réserve confidentialité)

Julien Dumont GDN-100 2

2

Présentation de l'examen


- ▶ CNAM : Mémoire de 30 pages sur un projet.
- ▶ Possibilité de choisir :
 - un projet personnel
 - un projet professionnel
 - un projet dans le cadre de votre alternance
- ▶ Possibilité de choisir une opportunité ou un projet déjà démarré.
- ▶ Pas nécessairement un projet informatique.

Objectifs du cours

- ▶ <https://bedeo.cnam.fr/public/unite/pdf/GDN100>
- ▶ 38h de cours
 - Revue de la théorie
 - Pratique au travers de la découverte des outils :
 - ✓ *Planification*
 - ✓ *Budget*
 - ✓ *Risques*
 - La gestion de l'équipe
 - Les documents importants
- ▶ Bonnes pratiques

Qu'est ce qu'un projet ?

- ▶ **ISO 21500** : « un ensemble unique de processus, constitués d'activités coordonnées et maîtrisées, ayant des dates de début et de fin et entreprises pour atteindre les objectifs du projet. La réalisation des objectifs du projet requiert la fourniture de livrables conformes à des exigences spécifiques »
- ▶ **Important** :
 - Bien définir les exigences du projet
objectifs possibles :
 - ✓ Amélioration d'un service existant
 - ✓ Développement d'un nouveau produit
 - ✓ Traitement d'une obsolescence (SAV, légalité, pannes, sécurité, ...)
 - Inscrire la réalisation dans un planning.
 - Allouer des moyens pour le réaliser.
 - Être en mesure de gérer des modifications.
- ▶ **Qualité** : compromis entre Objectifs / Coût / Délai.



Julien Dumont

GDN-100

5

5

Contexte et enjeux

Inscrire le projet dans un contexte au travers de différentes dimensions



Économique :
Rentabilité, budget, revenus.



Sociale/ humaine :
Qui est mobilisé, quelles sont les parties prenantes



Politique :
Réglementation, géopolitique, ...



Culturelle :
impact intellectuel, artistique, historique etc.



Environnementale :
Prise en compte de l'impact écologique.



Concurrentielle :
Brevets, innovation, part de marché.

Julien Dumont

GDN-100

6

6

Moyens et objectifs

- ▶ Un projet mobilise des moyens appelés ressources (Humaines, matérielles, équipements, matières premières, informationnelles, financières)
- ▶ Les résultats attendus du projet sont appelés fournitures, produits et sont caractérisés par des livrables.
- ▶ Types de projets
 - Des ouvrages (génie civil, agrandissement usine, ...)
 - Des produits (tangibles/intangibles)
 - Recherche (nouveau matériau, technologie nouvelle, brevet, ...)
 - Des services (par exemple : un déménagement, un événement promotionnel)
 - Un changement (exemple : fusion avec un concurrent)

Les intervenants

- ▶ Maîtrise d'ouvrage (Commanditaire)
 - Définit les attentes et moyens.
- ▶ Maîtrise d'œuvre
 - Est responsable de la réalisation et de l'utilisation des moyens.
- ▶ Qui est chef de projet ?
- ▶ Equipe projet à définir (personnes clés du maître d'œuvre et du maître d'ouvrage).
- ▶ Comité :
 - Coproj : Comité projet : réunion régulière de suivi (très fréquente)
 - Copil : Comité de pilotage : réunion des décisions d'ajustement, de validation des jalons (aspects contractuels) (fréquente)
 - Codir : Comité de direction : réunion d'arbitrage (escalade du Copil) (rare)
- ▶ Ne pas oublier les autres parties-prenantes à identifier (ceux qui ont un intérêt positif ou négatif sur le projet) :
 - Utilisateurs / bénéficiaires / clients
 - Direction / actionnaires

RACI Les rôles dans un projet

► Pour chaque activité d'un, on définit les responsabilités :

- **R - Responsable (Réalisateur ou Acteur en français)**
 - ✓ Il réalise. Il s'agit de la personne en charge de l'exécution de la tâche. C'est celui qui effectue le travail. Chaque tâche nécessite une personne responsable, mais plusieurs personnes peuvent partager cette tâche.
- **A - Accountable (Approbateur)**
 - ✓ Il supervise et rend compte du travail effectué. Il doit approuver l'effort produit par le réalisateur. Il veille à ce que la tâche soit exécutée conformément au plan du projet, il valide le livrable. Il répond des résultats, mais aussi de l'état d'avancement des travaux... A savoir que ce n'est pas forcément le responsable du projet.
- **C - Consulted (Consulté)**
 - ✓ Il délivre des conseils dans son domaine d'expertise pour accomplir une tâche, évaluer une situation, une production ou un livrable. C'est une partie prenante clé. Il n'a pas le pouvoir de prendre des décisions, mais il doit être consulté avant tout choix.
- **I - Informed - (Informé)**
 - ✓ Il est informé de l'état d'avancement du projet ou de la tâche, des changements et des résultats. Il s'agit généralement des parties prenantes qui ne contribuent pas directement aux projets, mais qui ont besoin d'en connaître la progression des grandes phases et le cas échéant des difficultés critiques rencontrées.

Matrice Raci - principes


► La matrice RACI

- **Définit des responsabilités claires au sein d'une organisation ou d'un projet.** En inscrivant des noms réels, l'organisation doit décider qui jouera quel rôle dans un projet. Rien ne reste vague et les gens se sentent en quelque sorte responsables.
- **Assure un même niveau d'information au sein des parties prenantes.** Cette matrice permet facilement de savoir qui sont les participants et comment intervient chaque membre de l'équipe au sein du projet
- **Est un modèle facile à utiliser.** Il suffit de croiser les noms et les tâches. Il est possible de s'assurer que personne n'a été oublié dans l'organisation du projet.
- **Permet de s'assurer que la charge de travail est répartie** équitablement entre les membres de l'équipe. Notamment si une personne doit gérer trop de tâches.

Raci - Exercice

► Enoncé :

- Vous travaillez dans une entreprise de taille moyenne. Il vous est demandé de développer un site web de vente en ligne des produits fabriqués par la société vers sa clientèle de particuliers. Proposez une matrice RACI.

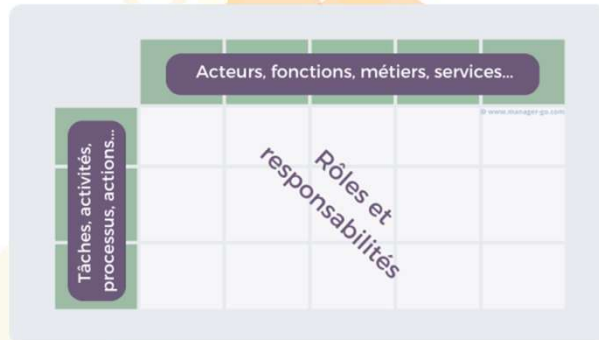

Julien Dumont

GDN-100

11

11

RACI exemple de réponse

	Chef de projet	Informat.	Market.	Formation	Ventes
1 - Expression des besoins	R		R,A	I	C
2 - Définition du cahier des charges	R,A	C	R		I
3 - Développement	A	R	I		
4 - Réception de l'application	R		R,A		
5 - Formation des utilisateurs				R,A	
6 - mise en production	A	R	R		I

R - Responsable / A - Accountable / C - Consulted / I - Informed

Exemple de Matrice RACI

Source : <https://www.manager-go.com/gestion-de-projet/dossiers-methodes/matrice-raci>

Julien Dumont

GDN-100

12

12

Conclusions RACI

- ▶ La structuration du projet dépend des rôles que vous allez attribuer :
 - Granularité des tâches et de l'organisation.
 - Fonctions du chef de projet.
 - Limites perçues du projet
 - ...
- ▶ Il n'est pas nécessaire de référencer des personnes physiques.
- ▶ La matrice RACI doit évoluer avec l'évolution du projet.
- ▶ Celui qui valide n'est pas celui qui réalise.

Management de projet

- ▶ Faire face à l'incertitude et aux aléas.
 - S'assurer des besoins du commanditaire
 - Donner un cadrage pour la préparation et la mise en œuvre
 - Appliquer les techniques adéquates pour chaque phase
 - Piloter le déroulement
 - Gérer les risques
- Ajustement « délai/coût/qualité » (hausse / baisse)



15



16
